CONSORZIO DI BONIFICA SUD

Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno

Via S. Antonio Abate
66054 VASTO (Ch)

DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO

Opere di completamento

- 1° Intervento -

PROGETTO ESECUTIVO

Lotto 9
- Sistemazione ammasso roccioso -

Allegato N°

12

CRONOPROGRAMMA LAVORI

STUDIO

C.& S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl

Via Cavour, 45
66010 Palombaro (Ch)
Tel. 0871/895660 fax 0871/895218
e-mail: info@c-sdigiuseppe.com
Homesite: www.c-sdigiuseppe.com

ACCREDIA

ABICert l'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n. QBC151

ABICert l'ente di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 Certificato n. ABC033

ABICert l'ente di certificazione BS OHSAS 18001:2007 Certificato n. SBC004

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

C. & S. DI GIUSEPPE
INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l.
D.T.: Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE

CONSULENTE

Prof. Ing. Albino Lembo-Fazio
Viale Santi Pietro e Paolo, 34 - 00144 Roma

APPROVAZIONI

IL R.U.P.
Geom. Michele MAGNACCA

Il Commissario

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Progetto: 549

Committente: Consorzio Bonifica Sud

Numero: 549 | E | A | 12 Revisione 01

ELABORATO DA:
data

VERIFICATO DA:
data

Risultato verifica 1 2 3

DATA Dicembre 2016
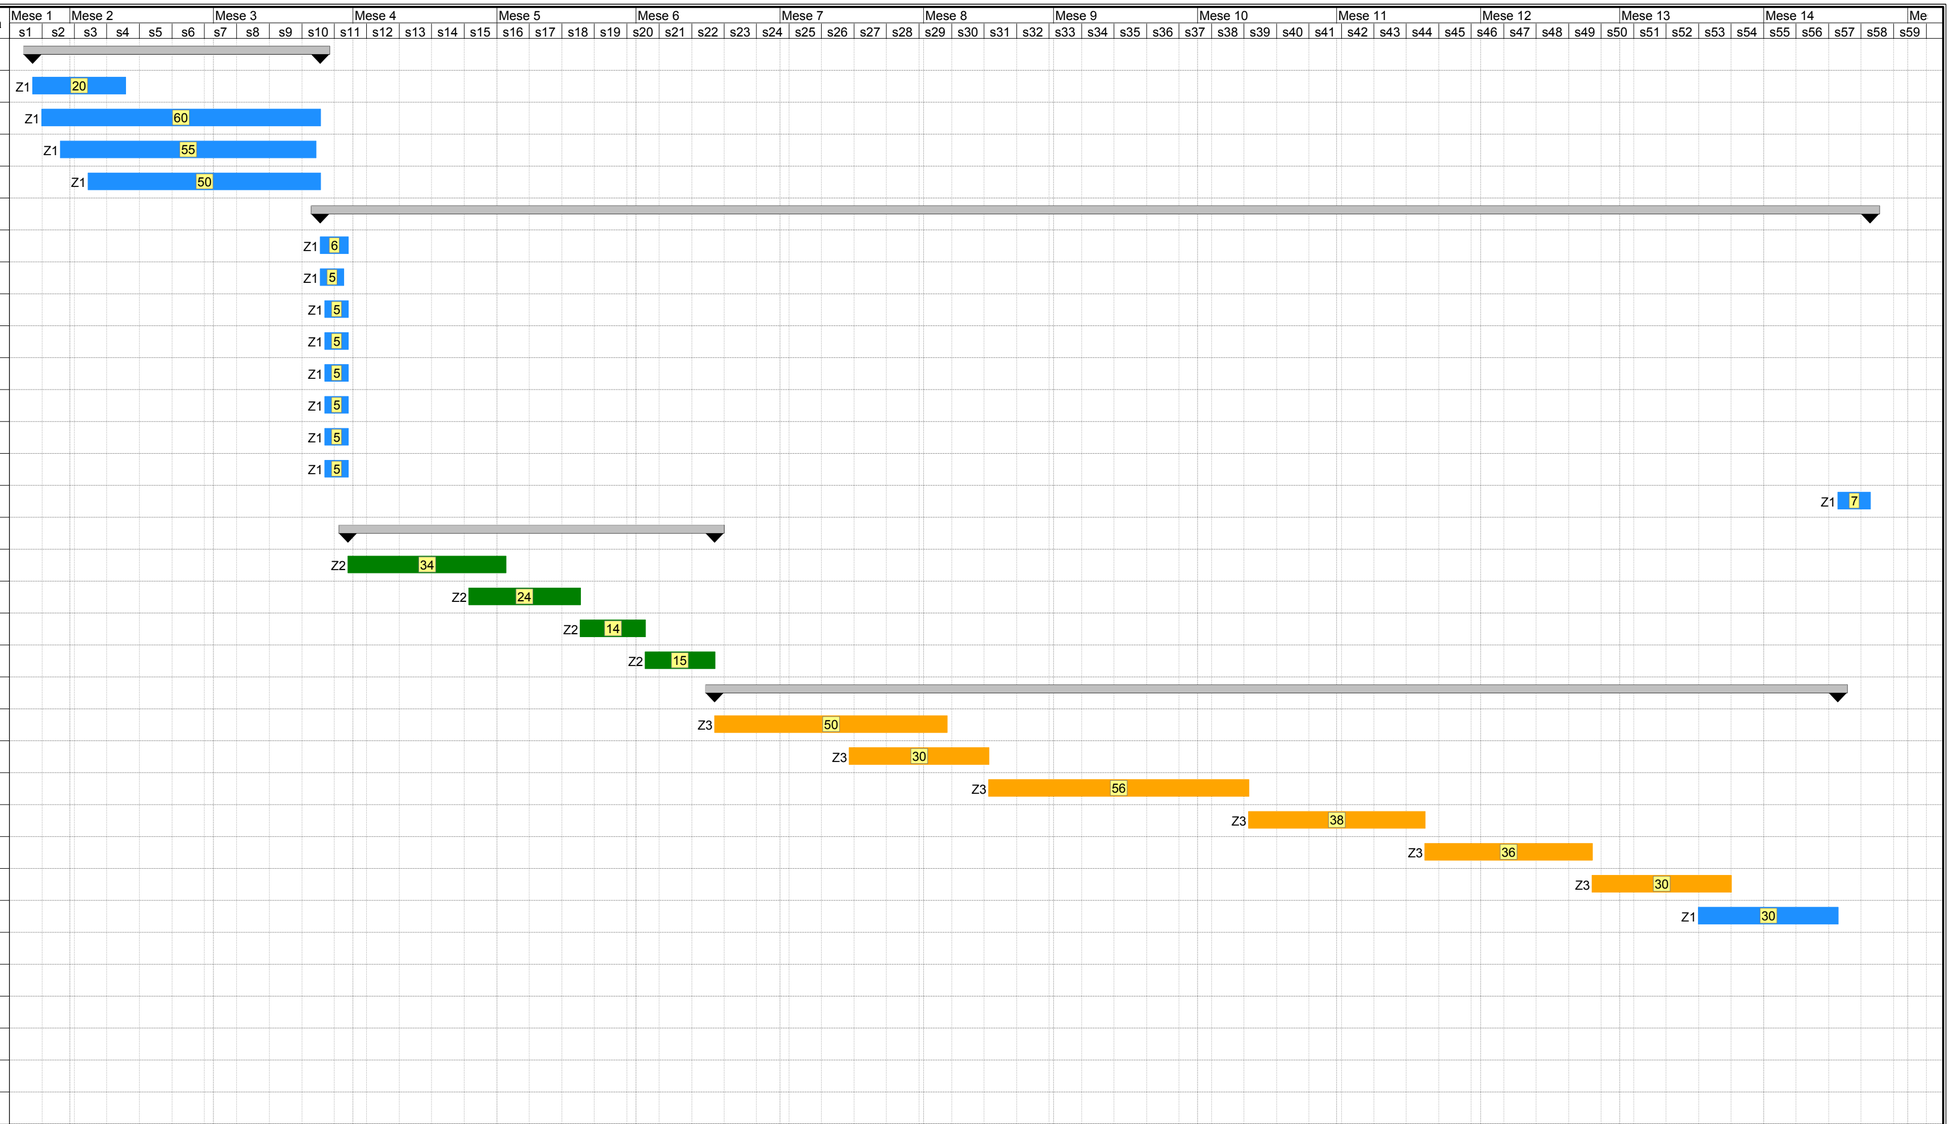
Nome attività	Durata
BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI	62 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordig	20 g
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	60 g
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	55 g
Scavo eseguito a macchina e a mano di avvicinamento ad ordigni belli	50 g
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE (durata lavori)	334 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone stoccaggio materiali e impianti fissi	5 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	5 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
INTERVENTI VERSANTE IN DX	79 g
Ispezione, disgaggio e bonifica versante	34 g
Stabilizzazione corticale	24 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	14 g
Realizzazione di barriere paramassi	15 g
INTERVENTI VERSANTE IN SX	242 g
Ispezione, disgaggio e bonifica versante	50 g
Montaggio di ponte provvisorio in acciaio	30 g
Protezione base ammasso roccioso	56 g
Consolidamento blocchi isolati con sottomurazione e chiodatura	38 g
Consolidamento blocchi isolati con legatura e chiodatura	36 g
Stabilizzazione accumuli di frana	30 g
Sistema di monitoraggio	30 g
DURATA TOTALE DELL'INTERVENTO	
(bonifica bellica e lavori) gg naturali e consecutivi	396
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	
Z2 = ZONA VERSANTE IN DX	
Z3 = ZONA VERSANTE IN SX
